

Orientering om framdrift i henhold til utbyggingsavtale bredbånd mellom Audnedal kommune og Altifiber AS

Dette dokumentet er en orientering om status og framdrift på fiberutbyggingsprosjektene i Audnedal kommunen. Innholdet bes publisert på kommunens nettsider slik at alle berørte husstander kan finne informasjon om fiberutbyggingen i sitt område. I tillegg til informasjonsskrivet sendes det ut informasjon til de som har bestilt i de forskjellige prosjektene når det skjer en endring i status. Informasjonsutsending i det enkelte fiberprosjektet følger i utgangspunktet følgende 4 trinn:




- 1= Informasjon i forbindelse med oppstart av salg på det enkelte prosjekt.
- 2= Informasjon om at mange nok har bestilt, og at beslutning om utbygging er tatt.
- 3= Informasjon om at utbyggingen av fibernettet starter.
- 4= Informasjon om at utbyggingen til eiendommen er ferdig, og at det er klart for oppkobling.

Vi minner også om at alle som skal få fibernettet levert i bakke må sørge for å grave røret inn til husvegg, samt melde fra til vårt kundesenter når det er gjort slik at montør kan ta kontakt for å avtale tidspunkt for oppkobling.

Generelt om avtalen med kommunen

Avtalen mellom Audnedal kommune og Altifiber forplikter Altifiber å bygge ut fibernett til alle fastboende innenfor de definerte prosjektene i kommunen i henhold til gitte kriterier. Frist for ferdigstillelse av bygging til de definerte prosjektene er august 2018. Opprinnelig framdriftsplan la opp til en salgs- og utbyggingsperiode som skulle vare til desember 2017, slik at det var en buffersone på 8 måneder til eventuelle forsinkelser som måtte oppstå. Det er på det rene at det er forsinkelser i forhold til den opprinnelige framdriftsplanen, og Altifiber jobber nå etter følgende reviderte framdriftsplan:

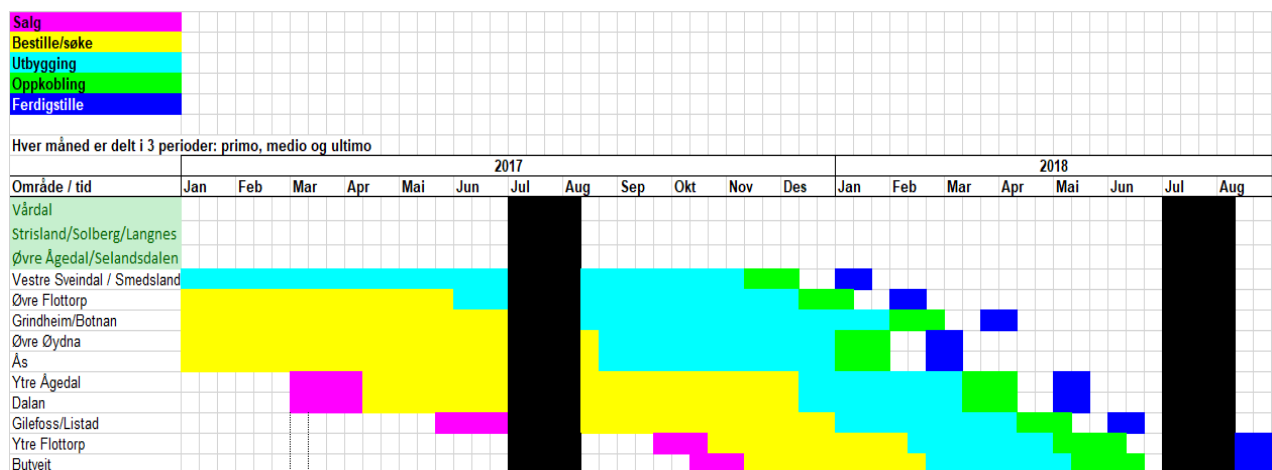

Informasjon om de enkelte utbyggingsprosjektene

Vårdal:

Prosjektet er ferdig, og sluttrapport er levert.

Strisland/Solberg/Langnes:

Prosjektet er ferdig, og sluttrapport er levert.

Øvre Ågedal/Selandsdalen:

Prosjektet er ferdig, og sluttrapport er levert.

Vestre Sveindal / Smedsland:

Området er ferdig bygd, og kun oppkobling av de som har bestilt gjenstår. Alle vil få tilbud om oppkobling i løpet av november måned, og prosjektet forventes ferdigmeldt før jul.

Øvre Flottorp:

Utbyggingen er godt i gang i dette området. Anleggsarbeidene forventes ferdig i løpet av november måned, slik at fiberarbeid og kundeoppkoblinger kan starte i desember.

Grindheim/Botnan:

Altifiber er klare til å starte utbyggingen i dette området. Så snart framdrift er koordinert med grøft som skal graves i regi av kommunen vil arbeidet kunne starte opp.

Øvre Øydna og Ås:

Utbyggingen er godt i gang i dette området. Anleggsarbeidene forventes ferdig i løpet av november måned, slik at fiberarbeid og kundeoppkoblinger kan starte i desember.

Ytre Ågedal og Dalan:

Dette området er ferdig planlagt og klart til oppstart. Utbyggingsperioden blir i januar-mars med oppkobling av kunder i mars-april.

Gilefoss / Listad:

Salg er gjennomført på dette prosjektet, og utbygging besluttet. Utbyggingsperioden blir i januar-mars med oppkobling av kunder i april-mai.

Ytre Flottorp:

Salg er gjennomført på dette prosjektet, og utbygging besluttet. Utbyggingsperioden blir i februar – april med oppkobling av kunder i mai.

Butveit:

Salg er gjennomført på dette prosjektet, og utbygging besluttet. Utbyggingsperioden blir i mars -april med oppkobling av kunder i mai-juni.
